

第一首都圏トンネル（北品川工区）

シールド掘進工事（調査掘進）の進捗状況

本工区のシールドマシンは、地上や道路等の周辺施設に影響なく進み、北品川非常口からの掘進長が約124 mの位置にあります。

曲線区間での掘進が続いたなかで、セグメントを組み立てにくい傾向が現れていたため、点検を実施したところ、シールドマシンのスキンプレーートの一部が変形していることが分かりましたので、スキンプレーートの形状を復元する一連の作業を行っています。

既にスキンプレーート背面の詰まりを除去する作業を終えており、現在、ジャッキを使っての復元作業を行っています。

北品川非常口付近の拡大図




2023年12月21日現在
シールドマシンは
ここにいます。

第一首都圏トンネル （北品川工区）の位置図



北品川非常口付近の断面図

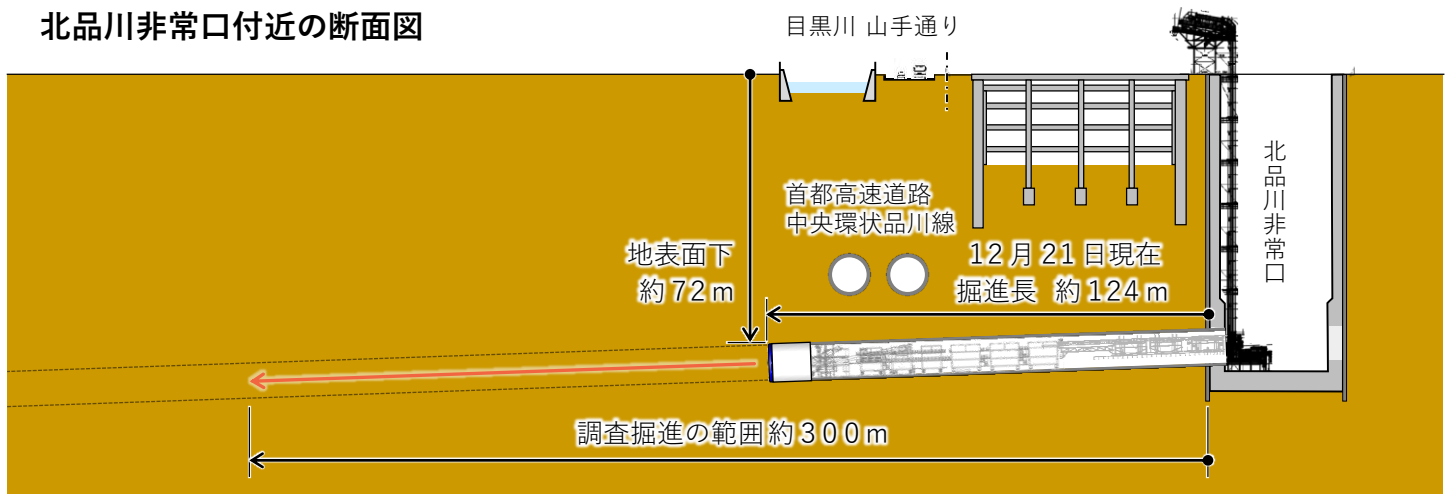

本工区におけるこれまでの経緯については、以下のリンク先をご覧ください。

> 工事に関するお知らせ https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/urban_shield-tunnel/progress/

> 説明会資料 https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/urban_shield-tunnel/description/

